Flocon

Gestion du linge mis à disposition dans des locations saisonnières

Réunion de lancement

PBS74 Consulting

22/01/2026

Enjeux

- Fiabiliser la gestion du stock de linge (draps, serviettes de bain) mis à disposition des vacanciers dans des locations saisonnières directement gérées par leur propriétaire qui sont des loueurs de meublé non professionnels.

- Assurer la traçabilité du linge tout au long du cycle d'utilisation.

- Réduire au maximum les pertes de linges et les coûts associés à ces pertes

Les flux actuels

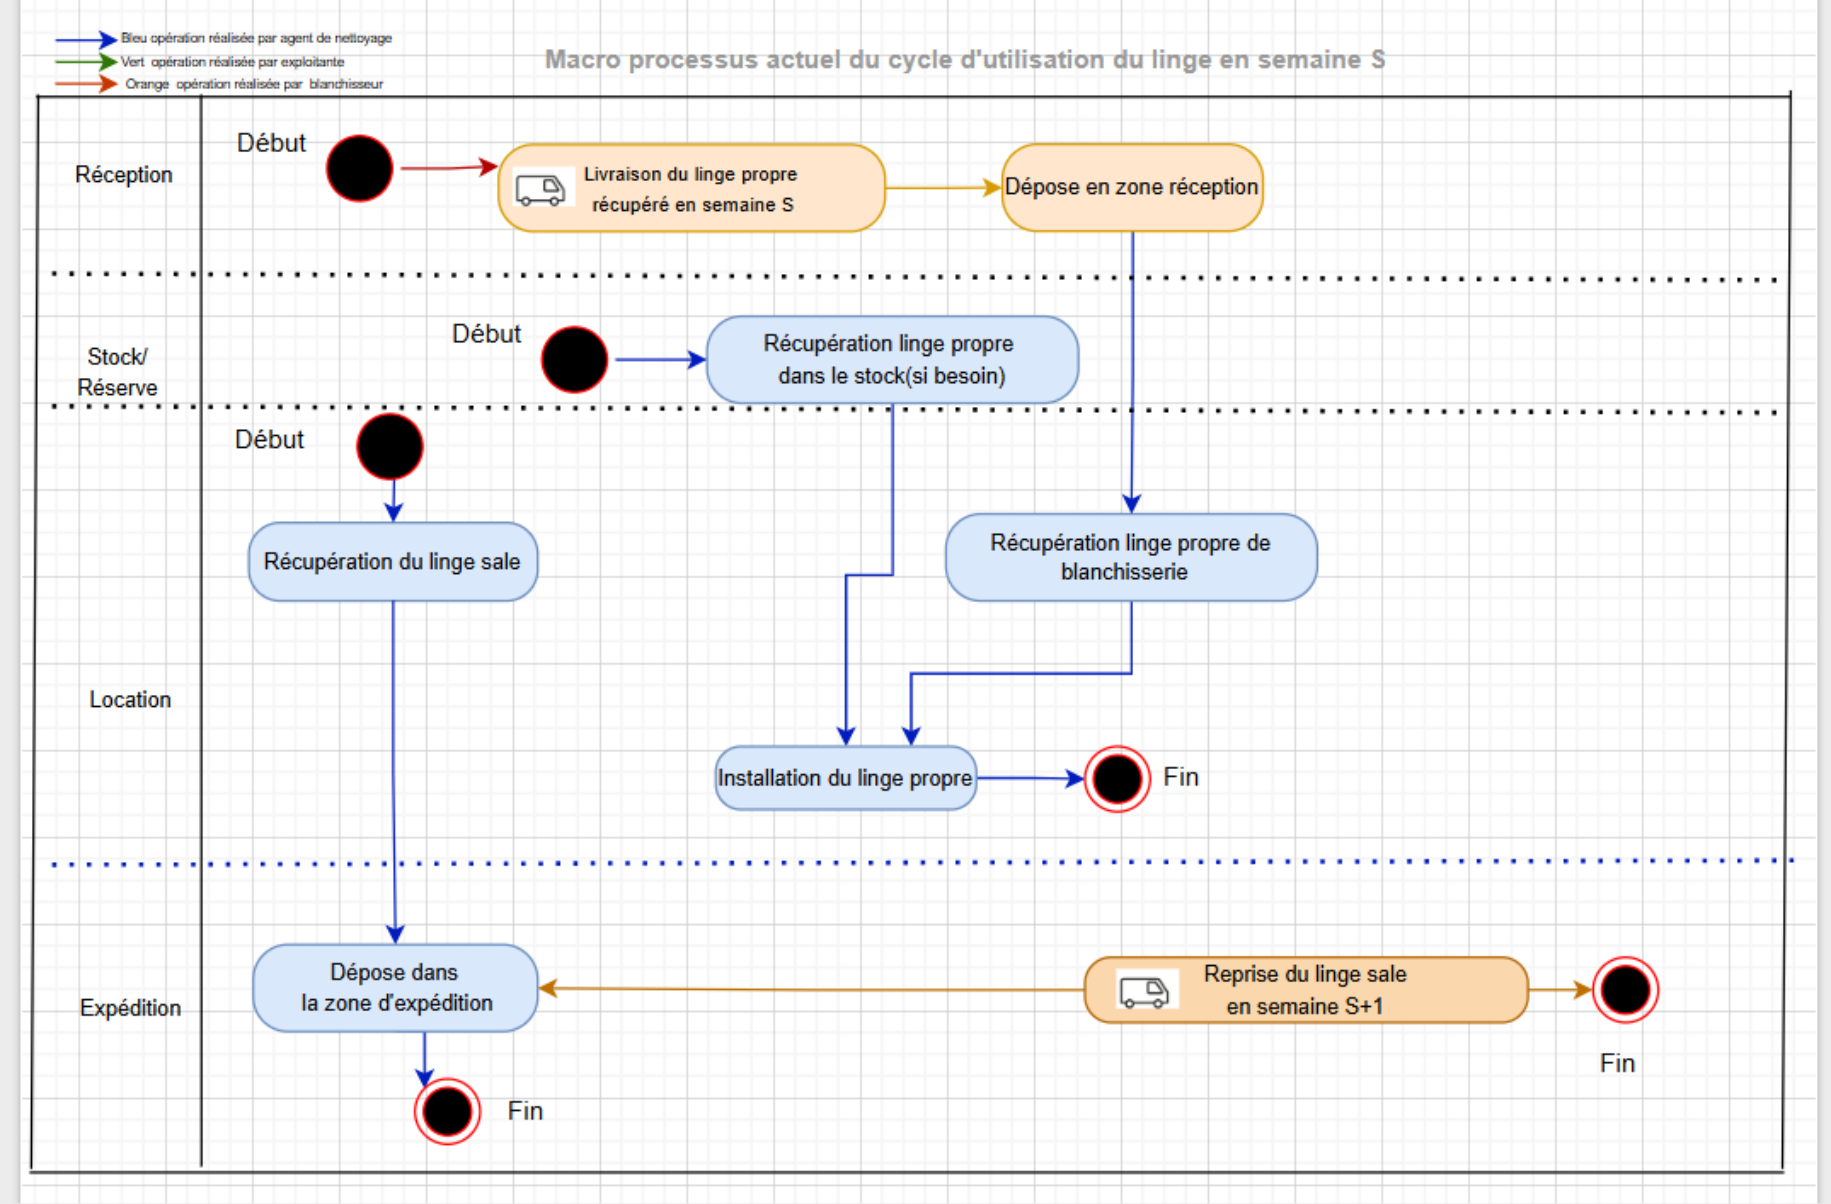

Contexte

- Cette étude concerne une activité qui se déroule dans des stations de ski villages.
- L'intervalle de temps entre le départ et l'arrivée des prochains locataires est très court d'où des délais d'intervention restreints pour les personnes qui assurent la remise en état des biens immobiliers dont le changement du linge.
- La fréquence des changements de locataires est la plus part du temps hebdomadaire
- Le nettoyage du linge est confié à des entreprises de nettoyage dont la taille et l'organisation ne permettent pas d'avoir une traçabilité précise

Constat

La perte du linge inexpliquée est un sujet coûteux pour les propriétaires

- 👉 Entre 15% et 25 % de linge perdu en moyenne annuellement.
- 👉 Peut représenter entre 600 € et 1500 € de perte annuelle
- 👉 Aucune gestion de stock d'où des écarts détectés tardivement au moment de la mise en place des appartements ou lors d'un inventaire en fin de saison.
- 👉 L'impossibilité de contrôler les factures du prestataire de nettoyage.

Objectifs

- 👉 Identifier les facteurs de pertes afin de réduire de 25 % les dépenses liées aux rachats de linge.
- 👉 Améliorer la gestion de stock
- 👉 Définir et mettre en place une solution permettant d'avoir une traçabilité du linge à chacune des étapes structurantes du cycle d'utilisation

Périmètre

- Une gestion et un suivi du stock total
- La traçabilité complète du linge reposant sur l'identification de chaque pièce de linge avec la possibilité d'une mise en place progressive des solutions : semi-automatisée puis plus automatisée via une solution intelligente s'appuyant sur un puçage RFID et une lecture pouvant s'effectuer en masse lors des opérations d'entrées, de sorties et de comptages
- La détection et le suivi des écart
- La mise en place d'indicateurs de pilotage
- La future intégration d'une technologie RFID

Hors périmètre : La gestion du stock et la traçabilité chez les prestataires de nettoyage

Facteurs clés de succès

- Proposer une solution modulable, simple, fiable, sécurisée et bien adaptée au contexte avec un coût raisonnable dans un objectif de commercialisation
- Adhésion des propriétaires
- Maitrise fonctionnelle et technique de l'équipe projet

Risques

- Adhésion des agents de ménages

- Pour la sous-projet traçabilité :

  - ⇨ Infrastructure innovante pouvant engendrer des coûts supplémentaires

  - ⇨ Environnement industriel pour les opérations de nettoyage avec des conditions difficiles (produits agressifs, humidité, chaleur) pouvant perturber le fonctionnement des puces RFID

Démarche projet

2 sous projets répartis dans le temps pour éprouver le socle de la solution avant d'ajouter une nouvelle technologie.

- ***La gestion des stocks et une traçabilité du linge*** **:** une mise en service de la solution de gestion de stock et de suivi du linge pour les locations estivales qui, en montagne, sont moins nombreuses et se déroulent sur une période beaucoup plus courte (du 04/07/2026 au 29/08/2026) que les locations hivernales. Ceci doit permettre d'éprouver et de fiabiliser la solution avant la forte activité de l'hiver.

- ***La traçabilité via RFID :*** la future solution basée sur la RFID nécessite une étude technique d'infrastructure et de résistance du principe d'identification dans les environnements industriels des entreprises de nettoyages. Cette solution nécessite la validation d'un POC (prof of concept) dont la réalisation d'effectuera sur Juillet 2026. La mise en service se fera début décembre 2026 au moment des premières locations hivernales.

Etapes projet

Pilotage

Lancement

- Définir : contexte, enjeux, objectifs, périmètre, démarche, organisation et planning
- Définir la cible
- Organiser et effectuer la réunion de lancement
- Valider le lancement

Conception

- Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques
- Valider les spécifications fonctionnelles et les spécifications techniques

Réalisation

- Constituer le système de développement
- Constituer les scenarii de tests
- Effectuer les tests unitaires
- Valider la réalisation

Tests d'intégration

- Préparer l'environnement de pré production
- Dérouler les scenarii de test par l'équipe IT
- Effectuer les Corrections
- Valider la nouvelle version

Tests acceptation utilisateurs

- Dérouler les scenarii de test par Utilisateurs clés
- Effectuer les Corrections
- Valider la nouvelle version

Préparation démarrage

- Préparer l'environnement de production
- Valider la procédure de mise en production et le temps d'indisponibilité du SI

Démarrage

- Prononcer le GO/NO

Recette définitive

- Stabiliser la nouvelle version
- Recetter la nouvelle version

Management du changement & communication

- Communiquer Sur lancement du projet
- Accompagner les Utilisateurs clefs pour élaboration des scenarii de tests
- Accompagner les Utilisaterurs cles pour exécution des scenarii de tests
- Identifier les impacts sur organisation & procédures
- Mettre à jour la documentation
- Organiser formations com plémentaires si besoin
- Communiquer sur le démarrage
- Organiser l'assistance au démarrage
- Communiquer sur le démarrage nouvelle version
- Assister les Utilisateurs Finaux

Planning projet étape 1 : Gestion de stock et suivi du linge

IT | Métier | Métier/IT

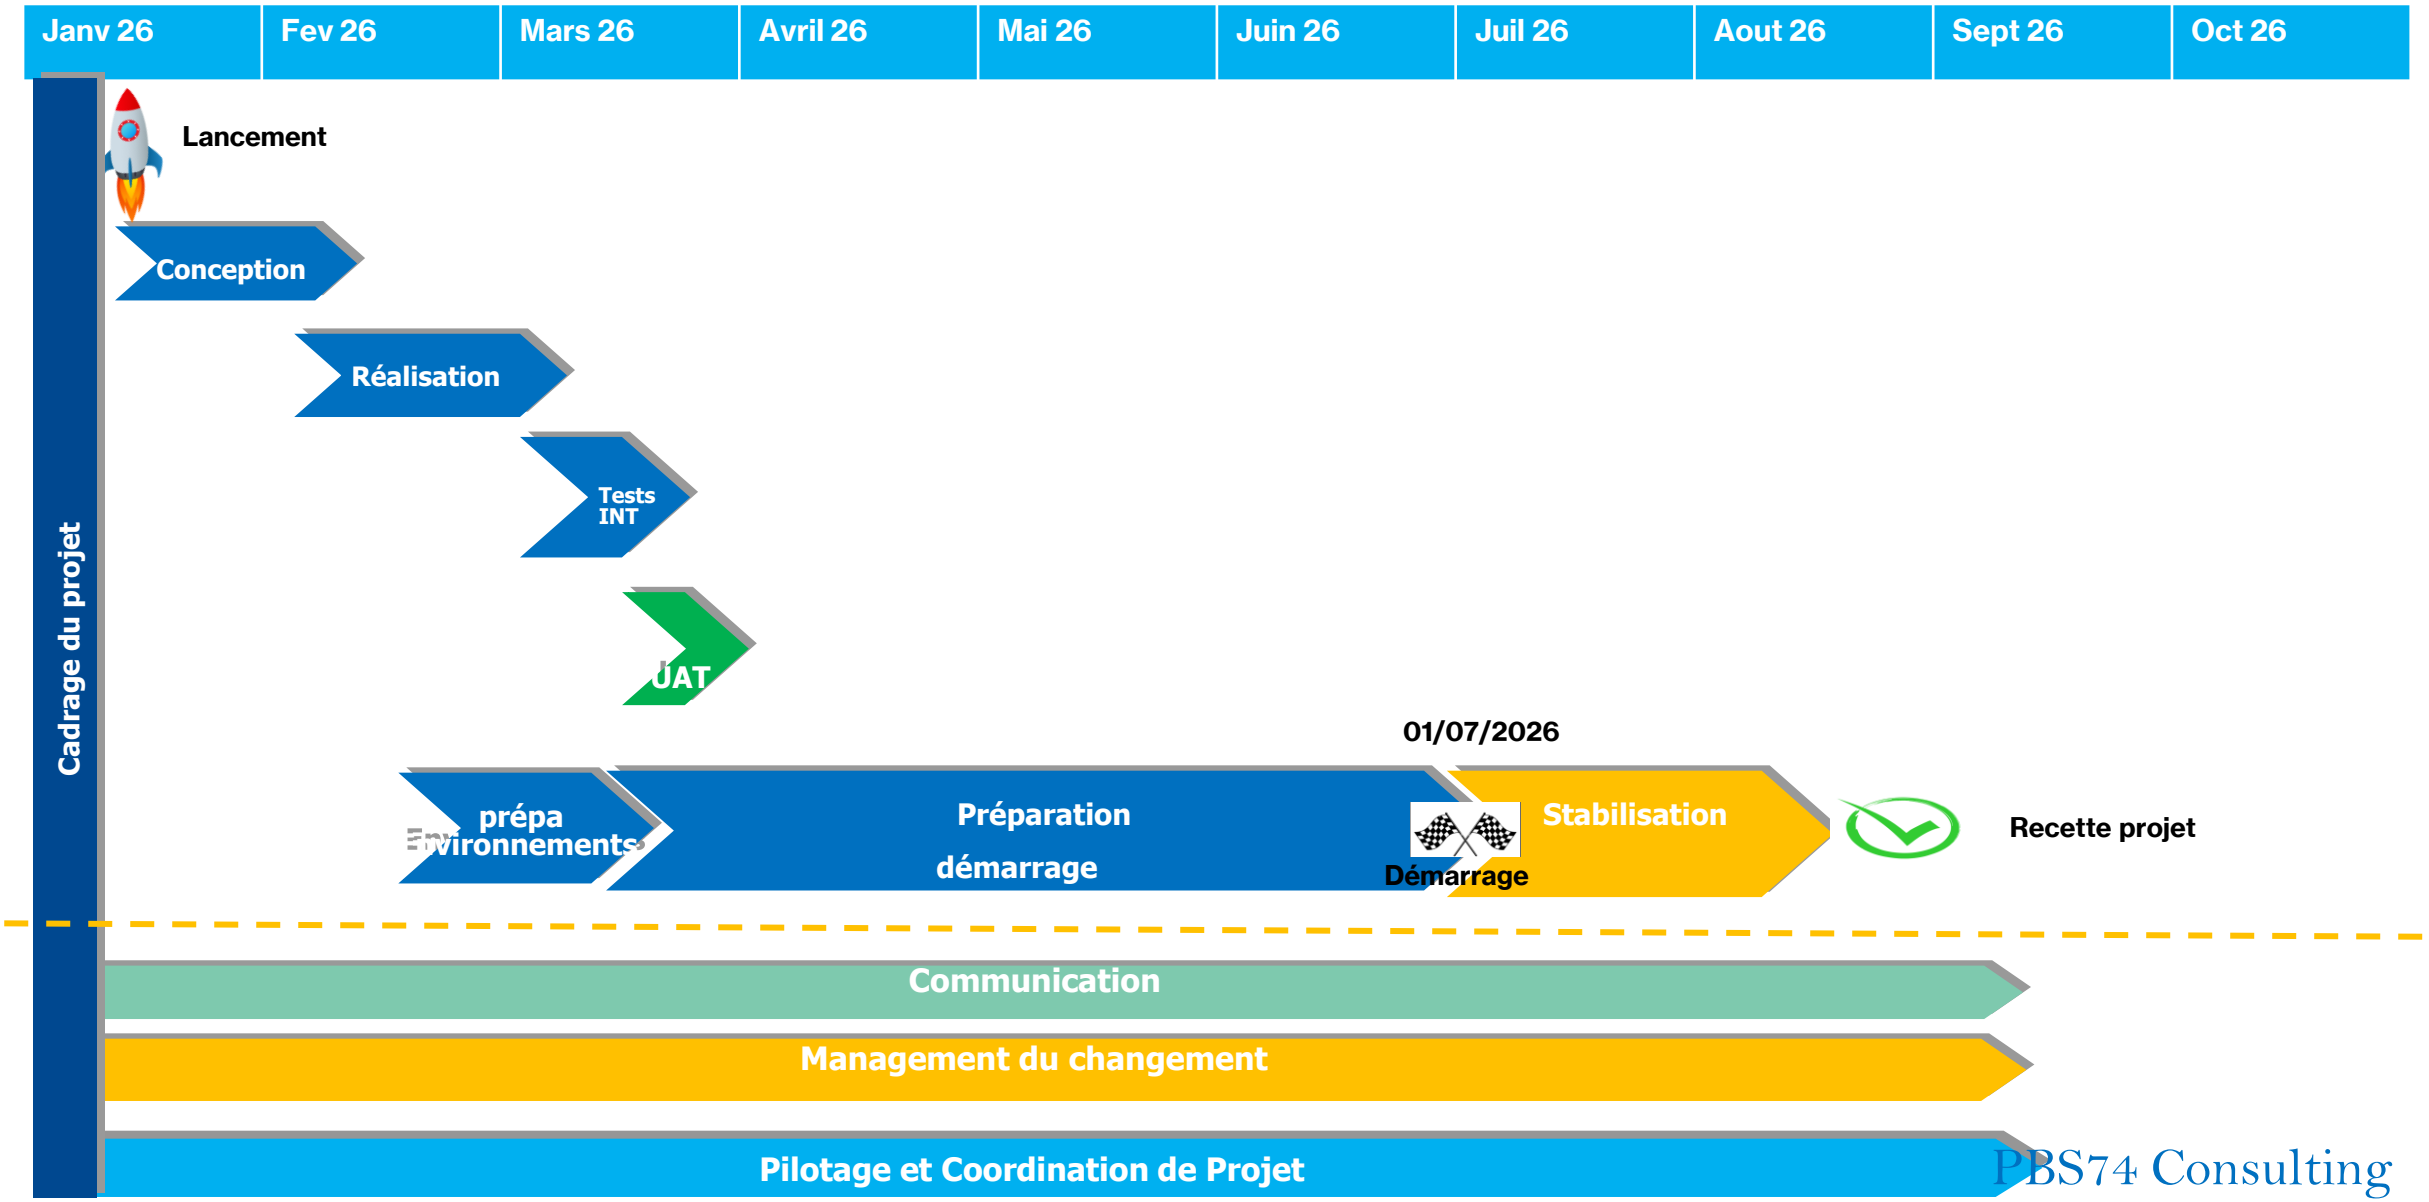

PBS74 Consulting

Planning projet étape 2 : Gestion de stock et suivi du linge via RFID

IT | Métier | Métier/IT

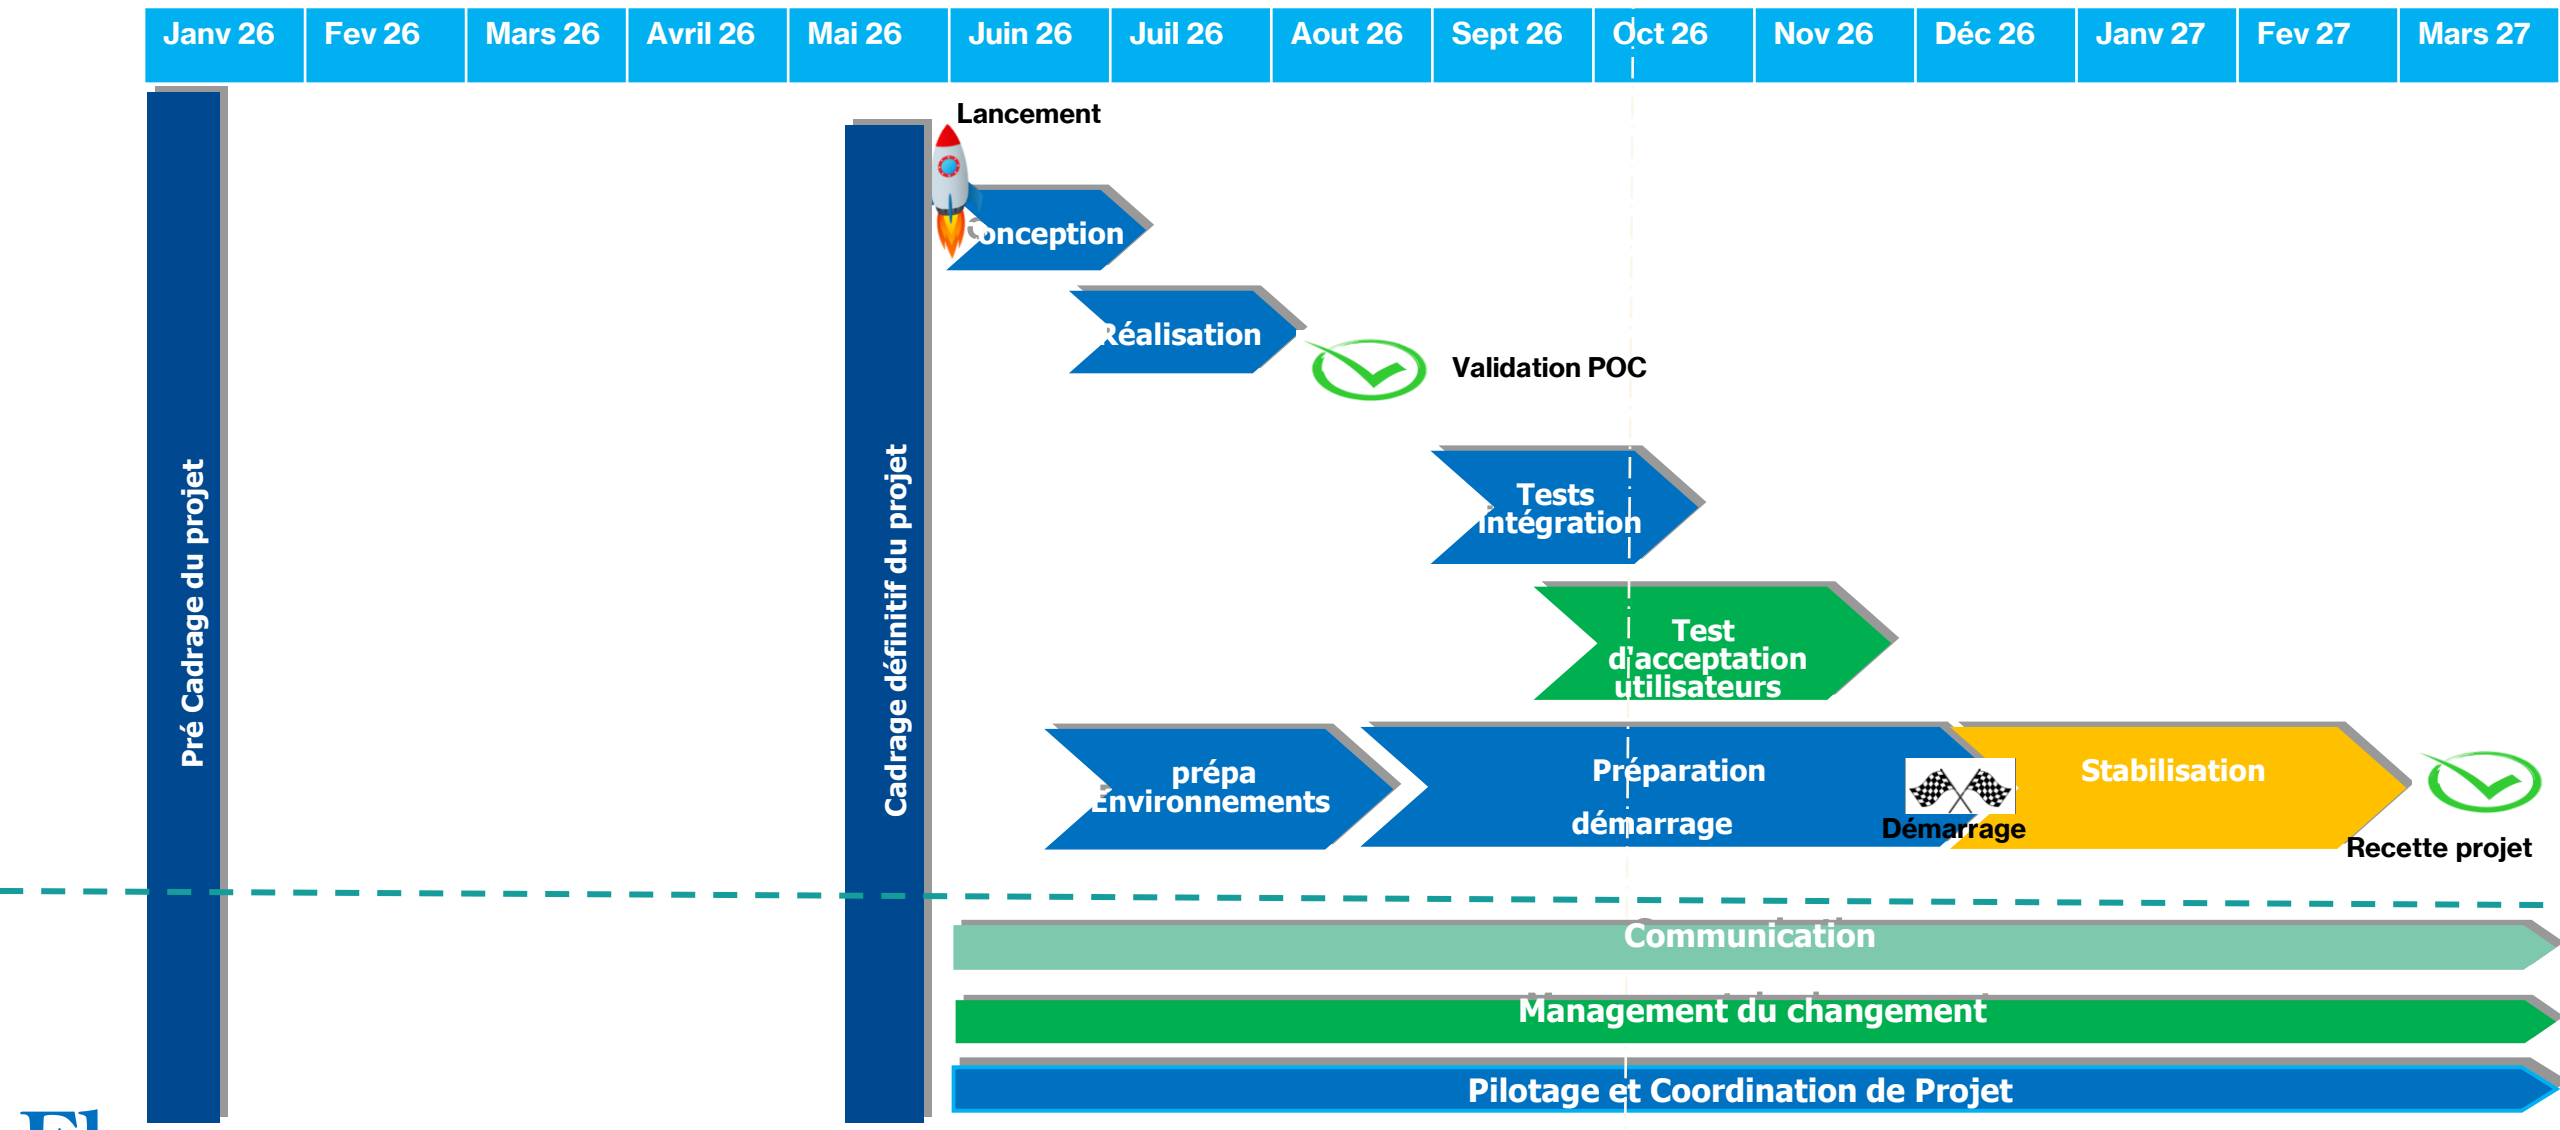

Flocon

PBS74 Consulting

Organisation de l'équipe projet

IT | Métier | Métier/IT

L'organisation sera très simple compte tenu de la taille et des besoins du projet. Une même personne pourra avoir plusieurs fonctions

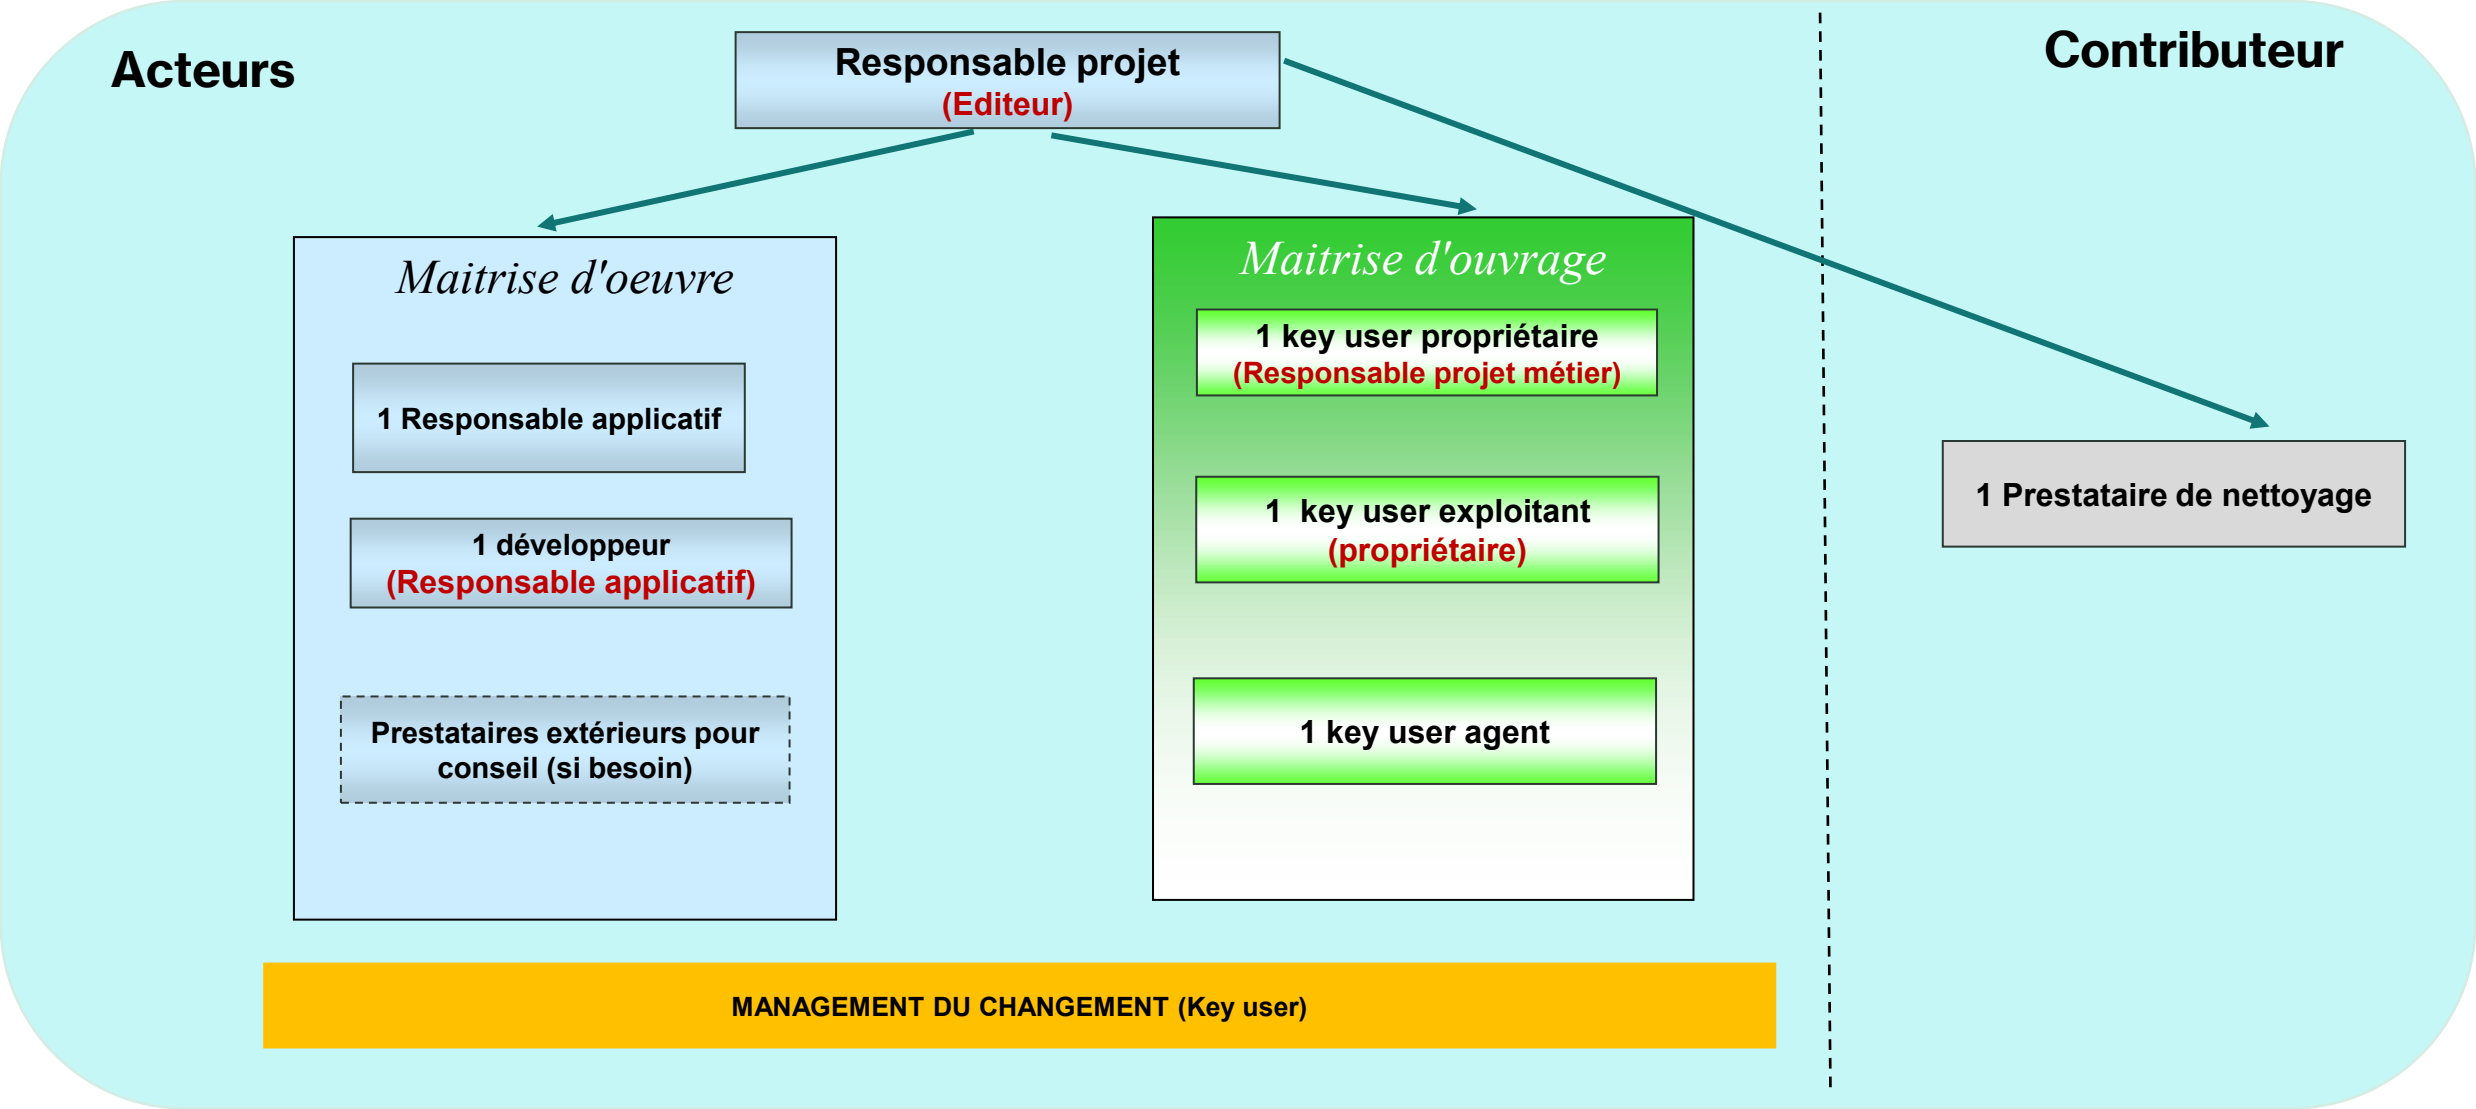

Rôles et responsabilités des acteurs: Équipe projet

IT | Métier | Métier/IT

Equipe IT (MOE)

Fonction représentative	Responsabilité	Rôle
Editeur/responsable projet	Responsable et garant de la solution proposée Responsable hiérarchique des équipes IT Responsable fonctionnel des acteurs et des contributeurs métier Responsable de toute l'équipe projet, du planning et du budget. Responsable de la sécurité et de la protection des données utilisées.	-Analyse les besoins -Conçoit,, fait évoluer et maintient la solution logicielle. -Valide la faisabilité des spécifications fonctionnelles -Met en place une organisation pour assurer une continuité de service aux clients -Assure le pilotage et la coordination du projet -Assure la communication au sein de l' équipe projet -Chaque semaine, il organise des comités projets avec les représentants métier et IT
Responsable d'application	Responsable du planning et des moyens techniques nécessaires à l'application (postes de travail, environnement de développement , de tests, de production....) Responsable du bon fonctionnement de l'application de sa cohérence et de sa sécurisation. Responsable fonctionnel du développeur et des prestataires IT	- Rédige les spécifications fonctionnelles. - Pilote et participe à l'analyse des besoins - Pilote et valide les développements et les points techniques - Travaille en collaboration avec l'équipe projet - Exécute les tests d'intégration pour valider les développements applicatifs. - Rédige et exécute les tests techniques
Développeur	Responsable du sous planning des développements Responsable de la qualité et de la sécurisation des développements fournis	- Réalise les développements en cohérence avec les spécifications fonctionnelles et le cahier des charges - Rédige et exécute les tests unitaires
Prestataire IT (facultatif)	Responsable des solutions proposées et mise en œuvre pour un sujet précis	- Assure un rôle de conseil et propose des axes de progression dans les domaines techniques, fonctionnels pour optimiser ou sécuriser une application et son environnement.. - En cas de sollicitation par le métier ou l'IT, sera fournisseur de moyens et/ou de solution.

Rôles et responsabilités des acteurs: Équipe opérationnelle

IT | Métier | Métier/IT

Equipe Métier

Fonction	Responsabilité	Rôle
Propriétaire	-Responsable du cahier des charges fourni -Responsable hiérarchique de l'exploitant -Responsable des accès au lieu de stockage -Responsable de la solution métier mise en place -Responsable fonctionnel de l'équipe MOA -Responsable des achats et des approvisionnements du linge	- Propriétaires du ou des biens immobiliers mis en location saisonnière. - Rédige le cahier des charges - Valide les spécifications fonctionnelles - Gère en direct ou fait gérer par un tiers (exploitant). - Gère les achats de linge pour le réassort du stock - Met à disposition un lieu de stockage du linge et les moyens d'accès aux intervenants - Participe au comité projet
Key User	Responsable de la solution mise en place sur sa sous partie du projet	-Participe à l'analyse des besoins Pour sa partie : -Valide le cahier des charges conception et les solutions proposées Conçoit les scénarii de test, les exécute et recette la solution - Intègre et communique sur les changements - Assure le support et rédige les procédures métier

Rôles et responsabilités des acteurs: Équipe opérationnelle

IT | Métier | Métier/IT

Equipe Métier

Fonction	Responsabilité	Rôle

Exploitant	Responsable hiérarchique des intervenants qu'il aura recruté ou nommé ou pour lesquels le propriétaire lui aura délégué ses pouvoirs.
	
	Responsable de la gestion du stock de réserve et du suivi du linge (traçabilité)
	
	Responsable des prestations fournies aux clients
		- Il recrute les intervenants, leurs confie des missions, s'assure de la coordination et vérifie que les prestations sont correctement effectuées.
		- Organise des points réguliers avec le propriétaire.
		- Met en place une organisation et rédige les procédures permettant de gérer :
		  ○ les absences
		  ○ l'assistance/support en cas d'incident
		- Garantir en permanence la disponibilité du stock de linge propre en quantité suffisante afin de répondre aux exigences et aux contraintes des locations saisonnières.
		- Assure la traçabilité du linge, le suivi, et la gestion du stock de réserve,
		- Rédige les procédures qui seront transmises soit pour permettre une continuité de l'activité en cas d'absence.
		- Dialogue avec l'exploitant
		- Organise des points réguliers avec le propriétaire.

Rôles et responsabilités des acteurs: Équipe opérationnelle

IT | Métier | Métier/IT

Equipe Métier

Fonction	Responsabilité	Rôle
Agent de nettoyage	Responsable de la préparation des appartements	- Assure le ménage pour un nombre d'appartements et un planning défini. - Selon la distance entre le lieu de stockage et les locations, il aura en charge d'acheminer le linge propre issu du stock vers chacune des locations et de récupérer le linge sale après les opérations de ménage
Blanchisseur	Responsable de la propreté du linge.	- Assure le nettoyage selon le planning de rotation défini avec l'exploitant. - Selon le contrat passé avec l'exploitant, il aura en charge d'acheminer le linge propre dans le lieu de stockage auquel il aura accès et dans ce cas il récupérera le linge sale .

Estimation charge et budget : sous projet 1&2

IT | Métier | Métier/IT

Fonction	Nombre de jours		Rôle
Analyse des besoins cahier des charges	3		Editeur et client (key user)
Pilotage projet	2		Responsable projet
Conception : rédaction spécifications fonctionnelles	15		Responsable d'application
Réalisation et tests unitaires	30		Développeur
Tests d'intégration	10		Responsable d'application
Test d'acceptation	5		Key users
Conduite du changement & communication	0,5		Key users
Préparation des environnements techniques	2		Equipe IT
Préparation démarrage	2		Equipe IT et équipe métier
Démarrage et stabilisation	5		Equipe IT et équipe métier
Total des charges	74,5		

	IT	Métier
Charge (Nombre de jour)	64	10,5
Budget (€)	16 250	2625

Questions/Réponses

IT | Métier | Métier/IT
